

REFERENZ

**Ehem. Augustinerchorherrenstift**

Steinerne Torbogen- und Fensterlaibungen, Solbänke  
2016-2016

Das Ziel der Restaurierung von Portallaibung, zwei Fensterlaibungen sowie vier Fensterbänken aus Högl Sandstein war der Substanzerhalt unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes.

**Maßnahmen**

Portallaibung:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung Fehlstellen
- Natursteinaustausch
- Fugenerneuerung
- Metallkonservierung
- Austausch Metallteile

Fensterlaibungen:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Entfernen Altputz
- Ergänzung Fehlstellen
- Fugenerneuerung
- Metallkonservierung
- Austausch Metallteile

Fensterbänke:

- Reinigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Ergänzung Fehlstellen
- Einschneiden einer Wassernase

**Ort**

Höglwörth

**Datierung**

1125 Gründung des Stifts

**Auftraggeber**

Privatbrauerei M.C. Wienerer

**Denkmalpflegerische Betreuung**

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

**Bearbeitungszeitraum**

2016-2016

**Material**

Sandstein



Gesamtansicht der Fassade mit bearbeitetem Portal und Fenstern nach der Restaurierung.



Die Portallaibung nach der Restaurierung.



Die Fehlstelle wurde durch ein Neuteil geschlossen. In das Neuteil wurden Scheinfugen eingearbeitet.




Fehlstellen an Solbank, Sturz und Laibung wurden mit Steinersatzmasse ergänzt und Risse und Schalen geschlossen.



Nach Rückarbeiten der alten Fenstekloben, bauseitiger Montage der neuen Kloben und Schließen der Einbindestelle mit Steinersatzmasse.



Fensterbank nach Reinigung, Sicherung von Rissen und Schalen, Ergänzung von Fehlstellen und Einschneiden einer Wassernase.

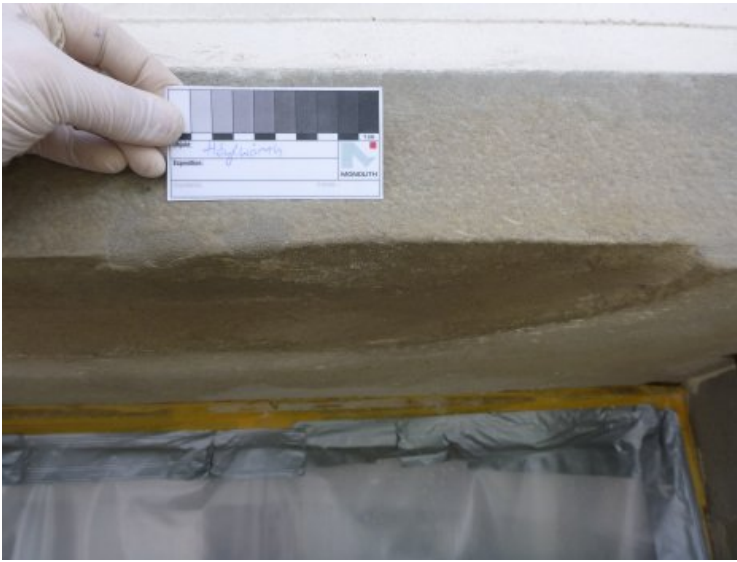

Nach Sicherung der großformatigen Schalen im Fenstersturz.

